Suivi du projet — vue client

Instantané du **2026-11-13**, calculé automatiquement depuis GitHub chaque semaine par `tools/suivi.dart` (workflow `suivi`). Ne pas éditer à la main. Les définitions sont celles de `docs/PROCESS.md` (§ Le suivi).

Les jalons

Débit des trois dernières semaines : **8.0** de charge par semaine. La fin prévue d'un jalon cumule le reste des jalons qui le précèdent.

Jalon	Terminé / total	Reste	Ajouté en cours	Fin prévue
J1 · Follow-up 2 (13/11)	18 / 25	7	11	2026-11-20
J2 · Follow-up 3 (18/12)	6 / 44	38	0	2026-12-23
J3 · Gel du MVP (21/01)	0 / 35	35	0	2027-01-22
J4 · Oral et rendu (05-07/02)	0 / 4	4	0	2027-01-26
S2 · Après le MVP	0 / 3	3	0	2027-01-29

À surveiller

- J1 · Follow-up 2 (13/11) : 11 de charge ajoutée en cours de jalon (44 %, seuil 10 %).
- 7 ticket(s) sans mouvement depuis 14 jours.

Avancement

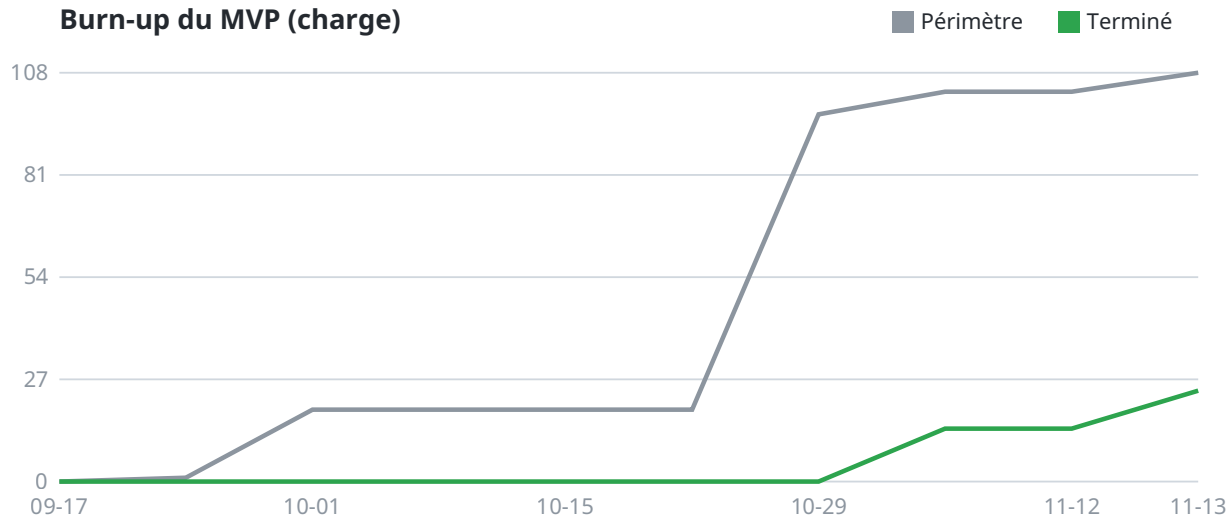

En gris, le périmètre du MVP (charge des tickets des jalons à échéance) ; en vert, la charge terminée. Un écart qui se creuse ou une courbe verte plate signale un blocage.

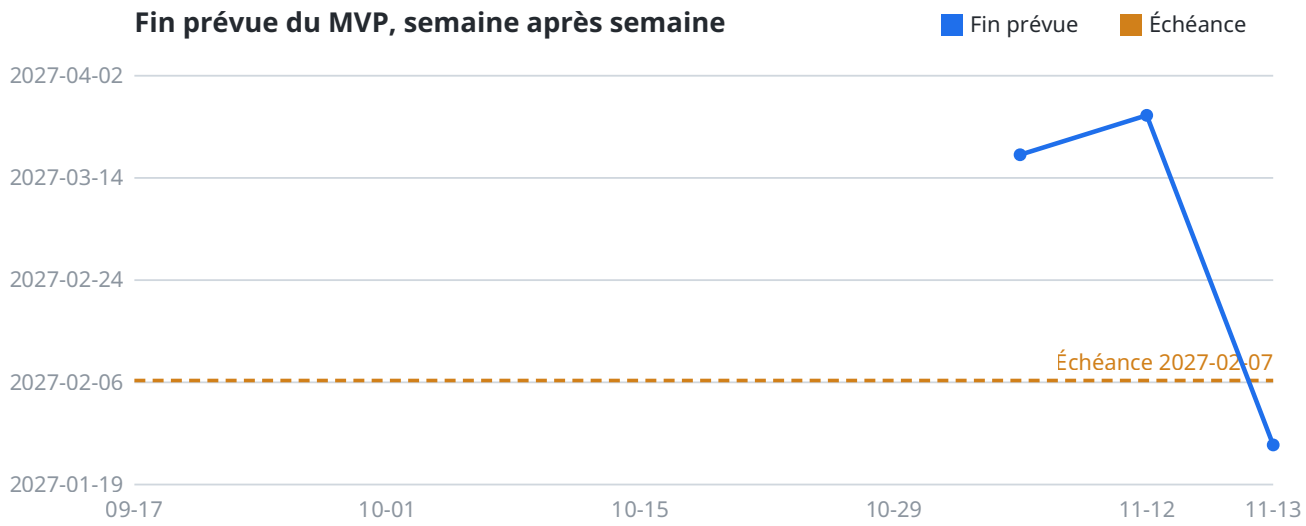

Chaque point est la fin prévue du MVP calculée cette semaine-là (reste divisé par le débit des trois semaines précédentes), face à l'échéance du 2027-02-07. Un point manquant : débit nul, aucune date calculable.

Flux

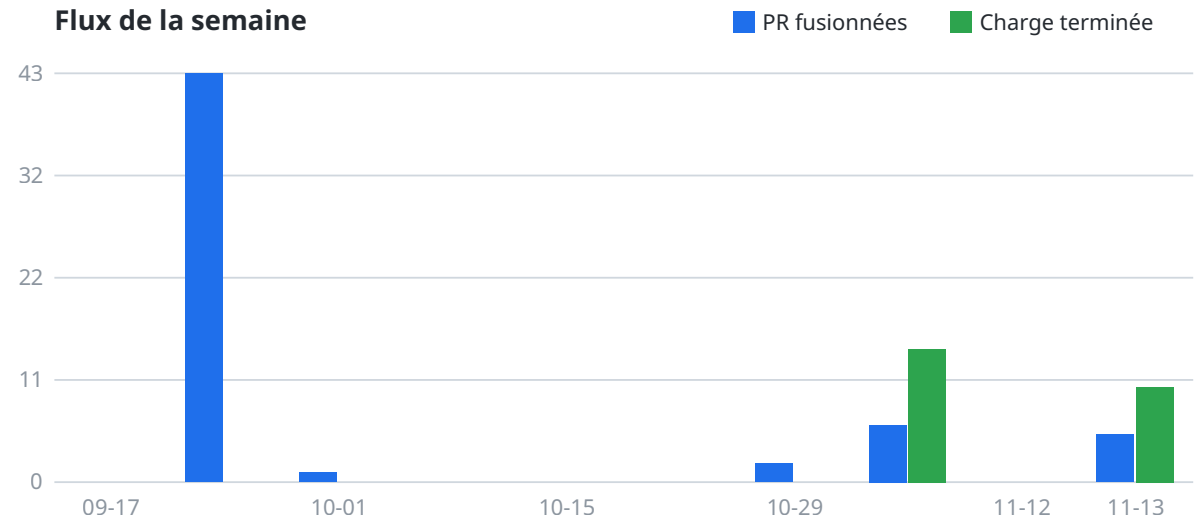

Indicateur	Valeur
Temps de cycle médian (premier commit → fusion)	0.1 j
Âge du plus vieux ticket en cours	17.1 j
Tickets sans mouvement depuis 14 jours	7
Délai médian avant la première relecture	—
PR fusionnées relues par une autre personne	0 %

Qualité

Indicateur	Valeur
Tests (unité / widget / intégration / SQL)	197 / 9 / 1 / 82

Indicateur	Valeur
Couverture du code de l'app (`lib/`)	89 %
CI verte sur 4 semaines	100 %

Contenu

- Pins rédigés / relus / publiés : 0 / 0 / 0 (cible : 7 à 10)
- Modèle 3D : trouve

Semaine par semaine

Date	Périmètre	Terminé	Reste	Débit	Fin prévue	PR fusionnées	Charge de la semaine	CI verte
2026-09-17	0	0	0	0.0	—	0	0	—
2026-09-24	1	0	1	0.0	—	43	0	84 %
2026-10-01	19	0	19	0.0	—	1	0	100 %
2026-10-08	19	0	19	0.0	—	0	0	—
2026-10-15	19	0	19	0.0	—	0	0	—
2026-10-22	19	0	19	0.0	—	0	0	—
2026-10-29	97	0	97	0.0	—	2	0	100 %
2026-11-05	103	14	89	4.7	2027-03-19	6	14	100 %
2026-11-12	103	14	89	4.7	2027-03-26	0	0	—
2026-11-13	108	24	84	8.0	2027-01-26	5	10	100 %

Limites connues

- **Reconstitution.** Les charges et les jalons n'existent que depuis le recadrage du 26/10/2026. La série est recalculée avec les étiquettes `charge:N` et les jalons **tels qu'ils sont aujourd'hui** : avant le 26/10/2026, elle ne reflète pas ce qui était prévu à l'époque, et les tickets d'avant le recadrage (sans charge) n'y figurent pas.
- Un ticket fermé compte comme terminé, quelle que soit la raison de sa fermeture ; un ticket rouvert compte comme jamais terminé.
- La CI ne compte que les runs déclenchés par une PR (les 500 plus récents) ; la couverture n'est mesurée que si le rapport lcov de l'app existe au moment du calcul.
- Les fichiers `instantanes/instantane-AAAA-MM-JJ.json` sont les instantanés bruts de chaque semaine ; `historique.json` est la série ci-dessus.
